


MATERIAL DE APOIO

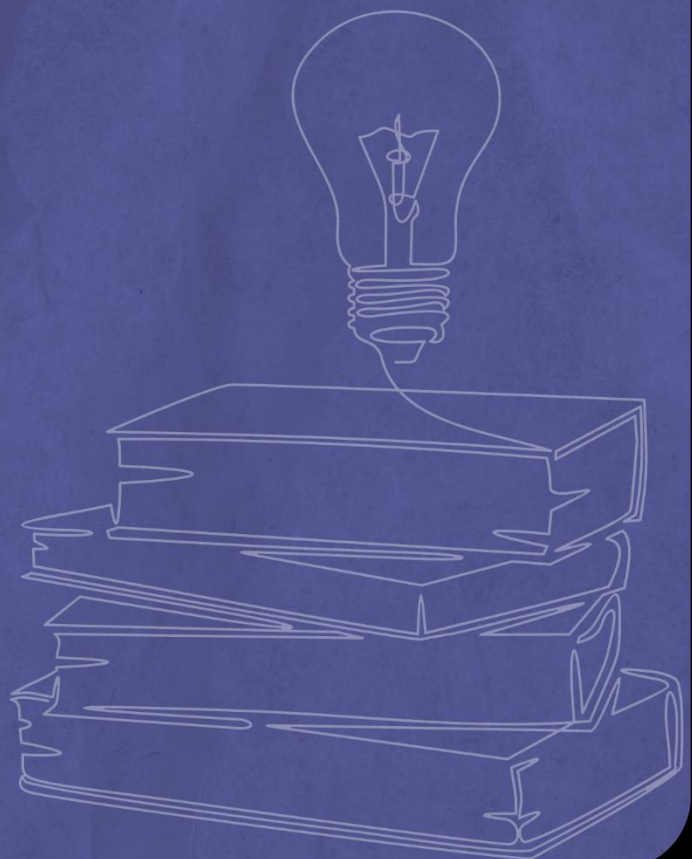

ESCRITÓRIOS DE PROJETOS

Os **Escritórios de Projetos**, ou **PMOs** (Project Management Offices), desempenham um papel fundamental na **gestão de projetos** dentro das organizações. Segundo o **PMBOK (Project Management Body of Knowledge)**, um PMO é uma entidade ou estrutura organizacional responsável por **padronizar processos** de governança de projetos, além de facilitar o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas entre os projetos. O conceito de PMO vem sendo cada vez mais abordado em provas de concursos públicos, especialmente em questões relacionadas à administração, gestão de projetos e governança organizacional.

Conceito de Escritório de Projetos (PMO)

Um **Escritório de Projetos (PMO)** é uma estrutura dentro da organização que tem como objetivo **gerenciar, padronizar e suportar** os projetos e programas executados. Ele pode variar em nível de controle e influência dentro da organização, assumindo desde funções consultivas até responsabilidades operacionais e estratégicas.

De acordo com o **PMBOK**, o PMO pode assumir diferentes formas e desempenhar funções variadas dependendo do grau de maturidade da organização e da complexidade dos projetos. As principais funções de um PMO incluem:

- **Suporte na governança de projetos:** Definir padrões, metodologias e melhores práticas para a gestão de projetos.
- **Gerenciamento de recursos:** Facilitar a alocação de recursos humanos e financeiros entre os projetos.
- **Treinamento e desenvolvimento:** Capacitar equipes de projeto por meio de treinamentos e workshops.
- **Monitoramento e controle:** Acompanhar o desempenho dos projetos, garantindo que estejam dentro do prazo, orçamento e qualidade esperada.
- **Suporte ao portfólio de projetos:** Priorização e seleção de projetos estratégicos para a organização.

De forma simples, um **Escritório de Projetos** é uma equipe ou departamento dentro de uma empresa que ajuda a organizar e gerenciar os projetos. Ele cria regras e métodos para garantir que todos os projetos sejam feitos da forma correta, dentro do prazo, do orçamento e com qualidade.

Tipos de PMO segundo o PMBOK

O PMBOK classifica os PMOs em três tipos principais, variando no grau de controle e influência que exercem sobre os projetos:

1. **PMO de Suporte:** Tem um papel consultivo, fornecendo **orientações, modelos, boas práticas, treinamentos e informações** para os gerentes de projetos. Não tem controle direto sobre os projetos e serve principalmente como um **apoio** para melhorar a execução dos mesmos.
 - Exemplo: Um PMO de suporte pode criar templates e guias para a elaboração de cronogramas ou relatórios de status, mas não interfere diretamente no andamento dos projetos.
2. **PMO de Controle:** Exerce um grau moderado de controle sobre os projetos, impondo **padrões, ferramentas e metodologias** que devem ser seguidas pelos gerentes de projetos. Ele realiza **monitoramento e auditorias** para garantir a conformidade com os padrões organizacionais.
 - Exemplo: Um PMO de controle pode exigir que todos os projetos usem um software específico de gerenciamento de projetos e acompanhem um cronograma padronizado de relatórios.
3. **PMO Diretivo:** Tem o mais alto grau de controle, **assumindo a gestão direta dos projetos** dentro da organização. Nesse caso, os gerentes de projetos reportam diretamente ao PMO, que tem a responsabilidade completa pela execução e entrega dos projetos.
 - Exemplo: Um PMO diretivo pode ser responsável por gerenciar diretamente todos os projetos estratégicos de uma organização, definindo metas, prazos e alocando recursos.

Características dos Escritórios de Projetos

1. **Centralização de informações:** O PMO atua como um repositório central para todos os dados e informações relacionadas aos projetos da organização, promovendo transparência e acessibilidade às informações.
2. **Padronização de processos:** Um dos principais papéis do PMO é garantir a **padronização** dos processos de gestão de projetos, como o uso de metodologias (PMBOK, Ágil, PRINCE2) e ferramentas.
3. **Apoio estratégico:** O PMO também atua no nível estratégico da organização, ajudando a alinhar os projetos com os **objetivos de negócio** e a garantir que os projetos estejam contribuindo para o sucesso da organização.
4. **Capacitação e desenvolvimento:** O PMO geralmente é responsável por treinar os gerentes de projetos e as equipes, promovendo a capacitação contínua dentro da organização.
5. **Monitoramento e controle de desempenho:** O PMO acompanha o andamento dos projetos, garantindo que eles sigam os padrões estabelecidos e estejam dentro do prazo, orçamento e qualidade.

Pontos Positivos do Escritório de Projetos

- **Aumento da eficiência e eficácia:** O PMO padroniza processos e práticas, o que resulta em maior consistência e eficiência na execução dos projetos.
- **Melhoria no gerenciamento de recursos:** Ao centralizar a alocação de recursos, o PMO ajuda a evitar conflitos e sobrecargas de trabalho, além de garantir o uso mais eficiente dos recursos.
- **Maior controle e visibilidade:** O monitoramento constante do progresso dos projetos oferece maior visibilidade à gestão, permitindo ajustes rápidos quando necessário.
- **Alinhamento com a estratégia organizacional:** O PMO garante que os projetos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização, contribuindo diretamente para seu sucesso.
- **Redução de riscos:** O PMO estabelece práticas de governança que ajudam a identificar e mitigar riscos, promovendo uma execução mais controlada e segura.

Pontos Negativos do Escritório de Projetos

- **Burocratização:** Dependendo do tipo e das funções desempenhadas, o PMO pode adicionar camadas de burocracia, exigindo relatórios e conformidade com padrões que podem ser vistos como excessivos, retardando a execução dos projetos.
- **Resistência à mudança:** Quando a implementação do PMO não é bem gerenciada, pode haver resistência por parte dos gerentes de projetos e das equipes, que podem sentir que estão perdendo autonomia.
- **Custo elevado:** A criação e manutenção de um PMO podem ter um custo elevado, principalmente em organizações menores, onde a estrutura necessária pode não ser justificada pelos benefícios.
- **Dependência:** Um PMO muito diretivo pode criar uma dependência excessiva, com os gerentes de projeto ficando menos proativos e mais reativos, esperando sempre a orientação do PMO.

Exemplo Prático de Aplicação do PMO

Uma grande empresa de **tecnologia** decide implementar um PMO para gerenciar seus diversos projetos de desenvolvimento de software. A empresa tem enfrentado dificuldades em **cumprir prazos e gerenciar recursos** de maneira eficiente, além de uma **falta de padronização** nos processos.

Ao implementar um **PMO de controle**, a empresa estabelece padrões claros para a execução dos projetos, incluindo o uso de metodologias ágeis e um software de gerenciamento de projetos centralizado. O PMO também realiza treinamentos com as equipes para garantir que todos estejam alinhados às melhores práticas.

Com o PMO em funcionamento, os projetos passam a ser monitorados de perto, e o PMO realiza auditorias periódicas para garantir que os prazos, custos e a qualidade estejam sendo respeitados. O resultado é uma melhora significativa na **entrega dos projetos**, além de uma maior eficiência no uso dos recursos e uma redução nos retrabalhos.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES**QUESTÃO 01**

Segundo VARGAS (2009), uma importante entidade a ser implantada em uma organização é o Escritório de Projetos ou PMO (Project Management Office). A respeito de suas funções, é INCORRETO afirmar que o PMO é responsável por:

Alternativas

- A) gerenciar restrições, como escopo, cronograma, custo e riscos dos projetos individuais.
- B) identificar e desenvolver metodologias, melhores práticas e padrões de gerenciamento de projetos.
- C) fornecer funções de suporte ao gerenciamento de projetos e também realizar o gerenciamento direto de projetos.
- D) estabelecer uma comunicação centralizada entre gerentes de projetos, patrocinadores, analistas e outras partes interessadas.
- E) monitorar a conformidade com as políticas, procedimentos e modelos padrões de gerenciamento de projetos por meio de auditorias do projeto.

QUESTÃO 02

Um Escritório de Projetos (PMO) pode ser classificado de acordo com o grau de controle e influência que exerce sobre os projetos. Qual tipo de PMO assume o gerenciamento direto dos projetos dentro da organização?

- A) PMO de Suporte
- B) PMO de Controle
- C) PMO Diretivo
- D) PMO de Consultoria

QUESTÃO 03

Com relação ao Escritório de Projetos (PMO) segundo o PMBOK, assinale a alternativa correta:

- A) Um PMO de Suporte tem total responsabilidade pela gestão dos projetos da organização.
- B) O PMO tem como uma de suas funções principais treinar os gerentes de projetos e as equipes.
- C) O PMO sempre atua diretamente na execução dos projetos.
- D) A padronização dos processos não é uma função desempenhada pelo PMO.

QUESTÃO 04

Um escritório de projetos (project management office – PMO) é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. A esse respeito, julgue os próximos itens.

A organização, a função e a estrutura específicas de um PMO não dependem das necessidades da organização à qual o PMO dá suporte.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 05

Um gerente de projeto e um escritório de projeto (PMO) são orientados por objetivos diferentes e, por isso, a responsabilidade do PMO é a de fornecer suporte ao gerenciamento de projetos, não cabendo a ele o gerenciamento direto de um projeto.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 06

As atribuições de um PMO incluem o fornecimento de funções de suporte ao gerenciamento de projetos e a responsabilidade pelo gerenciamento direto de um projeto.

CERTO () ERRADO ()
